



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 7

Datum : 2 maart 2018
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Maternal Labour Ward, Sinchu Baliya Health Centre, project nr. 2016-176, WG P2015-0446
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Financiële stand van zaken

Op 19 februari hebben we het laatste bijgewerkte bankboek toe gestuurd. Er is nog 4010.82 euro over van het projectgeld.

Voortgang

Na afloop van de regentijd hebben we de muren geschuurd om metselwerk op de blokken te verwijderen. Hierna hebben we een waterafstotende coating aangebracht in twee lagen. Deze is afwasbaar en beschermt de blokken tegen beschadigingen. De naden tussen de kolommen en de muren (dilataties) zijn dicht gemaakt met transparante siliconenkit. Op de plafonds hebben we een laag latex aangebracht als afwerking. De verlichting, stopcontacten en sanitair zijn gemonteerd.

Met de gebroken tegels die over waren van het tegelwerk hebben we Sander's naam aangebracht op de muur buiten.

In aparte frames bij de ramen hebben we horren geplaatst zodat deze als ze kapot zijn eenvoudig kunnen worden vervangen. In de consultatie kamer is er een werkblad met wasbak gemaakt.

In de bevallingskamer hebben we een railsysteem gemaakt waaraan douche gordijnen hangen als afscheiding tussen badkamer en bevalling bed. Tevens hangt er een gordijn achter de toegangsdeur om te zorgen dat het bevalling bed niet zichtbaar is van buitenaf bij het betreden van de kamer.

Afspraken/wijzigingen

Na schriftelijk overleg (mails 19-2) zullen we een paar extra aanpassingen doen om de waterdruk en water voorraad voor het gebouw te verbeteren. We plaatsen een watertoren van 5,5 meter hoog met tank van 1500 liter water. Als de druk van het hoofdnet niet voldoende blijkt te zijn zullen we een kleine pomp gebruiken om de tank te vullen met water.

Binnen hangen we een kleine keuken boiler (soort doorstroom verwarmers) die warmwater geeft aan douche en wastafel in de bevalingskamer.

Planning

Gezien de tijdelijke afwezigheid van Maarten om medische reden, zullen de genoemde werkzaamheden hierboven genoemd niet op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, maar zodra we daarvoor gelegenheid hebben.

Foto's



Metselwerk schoon gemaakt en klaar voor de water afstotende finishing



De betegelde "sluice" aan de zijkant van het gebouw



Plafonds gang zijn geschilderd




Schilderwerk in uitvoering



Aanbrengen van coating buiten



Hurk toilet bij de grote Ward

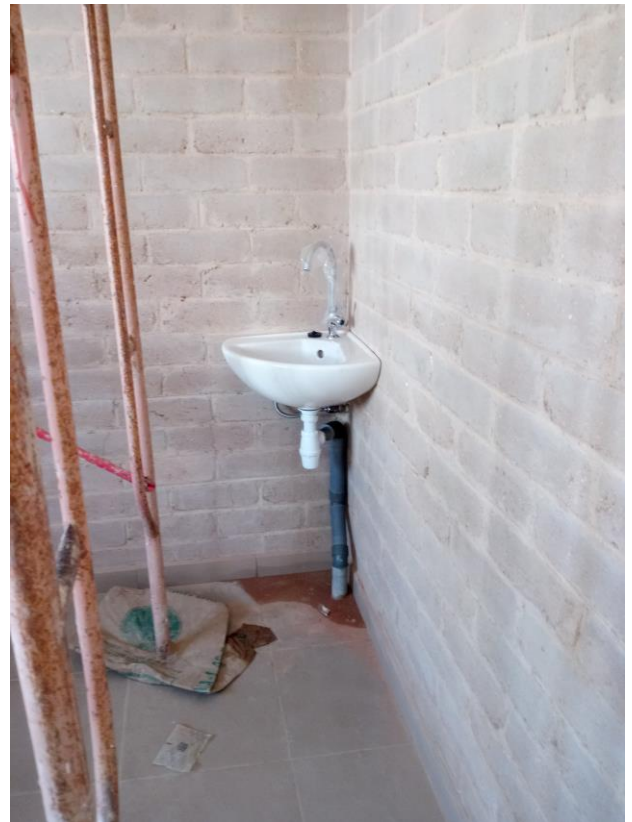

Hoek wastafel in de grote Ward



Muur coating wordt binnen aangebracht



Schoonmaak van de ruimtes



Het maken van "Sander's Clinic"



Resultaat



Het aanbrengen van gaas voor de horren



Het werkblad in de consultatie kamer



Werkblad met spoelbak erin



Verkoeling voor de grote Ward



Constructie voor de gordijnen rond het bevallingsbed
