



# Stichting Bouwen (The Gambia)

---

Stichting Bouwen (The Gambia)  
Coastal Road, Sanyang, The Gambia  
Tel. +220 7564201 / 7165180  
gambia@stichtingbouwen.nl  
facebook: Stichting Bouwen  
www.stichtingbouwen.nl  
Charitable Organization 79/2010

## RAPPORTAGE 5

---

Datum : 5 februari 2019  
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)  
Project : Renovation surgerywing fase 1 / 2, Banjul, project nr. 2016-172A&B  
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

---

### Voortgang

In de oude eye theatre zijn muren en kozijnen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe plannen. De nieuwe muren van de wc's en douches zijn gemetseld. Ook de muren van 1 meter hoog die de zaal scheiden van de observatie ruimte en de sluis ruimte zijn gemetseld. Het water leidingwerk voor deze fase is aangelegd waarbij we ook weer nieuwe hoofd afsluiters hebben gemaakt. Het afvoer leidingwerk hebben we door de vloer en hangend aan het plafond van de onderliggende ruimte weer aan gesloten op de bestaande riolering. We hebben hierdoor een beter afschot kunnen maken. De muren waar wandtegelwerk op komt zijn opgeruwd waarna de tegelzetter hier de wandtegels op heeft aangebracht. De isolatie plafondplaten zijn opgehangen en de verlichting is erop aangebracht. De elektra goten met stopcontacten zijn gemonteerd. De wandtegels zijn gevoegd. De schilder heeft de muren glad gemaakt en glasvlies behang aangebracht. Daarna is de grondverf aan gebracht.

### Afspraken/wijzigingen

Voor de 2<sup>e</sup> fase hebben we wederom 20 isolatie platen gebracht. Doordat we economisch gebruik hebben gemaakt hebben we 2 hele platen over kunnen houden. Samen met de over gebleven platen van fase 1 hebben we voor fase 3 een groot gedeelte/alles van het plafond al liggen.

### Planning

Het leggen van de vloertegels is al begonnen en zal worden af gemaakt. Het kozijnwerk zal besteld en geplaatst gaan worden. Montage van sanitair kan gedaan worden.

## Foto's



Sloopwerk van de muren die weg kunnen



Sleuven zagen voor de waterleidingen

Leggen van de leidingen

Aansluiten op bestaand net



Uitzetten van de nieuwe muren

De ruimtes krijgen vorm

Stukje ruimte erbij



Muren observatie en sluis op hoogte

Maken van de koof



Gipsplaten aanbrengen



Plafondplaten naar boven brengen



Monteren van de plafond platen



Nieuwe riolering



Laatste rij



Plafond zit erin



Tegelwerk



Montage elektra goten




Pleisterwerk buitengevel



Afwerking koof



Schilders aan het werk

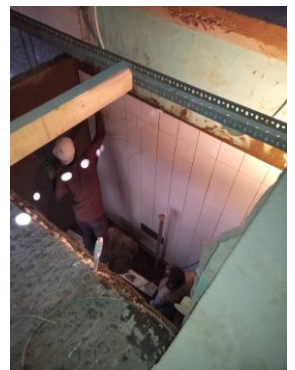

Tegelzeters in actie



Elektra boven het plafond



Eerste verflaag
