



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 8, tussenrapportage fase 3:

Datum : 7 oktober 2019
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Renovation Surgery Wing Phase 3: Small Theatre, Banjul, project nr. 2016-172C
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Financiële stand van zaken

We hebben alle grote uitgaven voor deze fase gedaan. Er volgen alleen nog kleine uitgaven. Zie ook bestand "Expenses d.d. 7-10-2019". De uitgaven liggen in lijn met de begroting.

Voortgang

Eerst is het sloopwerk dat gebeuren moest bij de kleine operatiekamer uitgevoerd. We hebben vervolgens de nieuwe afvoer voor de scrub en water aanvoer gelegd. De toegangsdeur is vergroot zodat een operatie bed makkelijker naar binnen kan. De nieuwe stenen borstwering die tussen scrub en operatiekamer komt is gemetseld. De muren zijn allemaal opnieuw van pleisterwerk voorzien zodat deze tegel en schilder klaar zijn. 1 mannelijke en 2 vrouwelijke studenten van de GTTI: technische hogeschool in Gambia, hebben vanaf eind juni tot begin september mee gewerkt aan het project om praktijk ervaring op te doen. De ophanging van de plafondplaten is aangebracht. De kabelgoten en elektra die boven het plafond komen zijn gelegd. Aansluitend zijn de wandtegels met tegellijm door de studenten tegen de gepleisterde wanden geplakt. We hebben de cementdekvloer laten aan brengen. De plafondplaten en ophanging voor de operatielamp zijn gemonteerd. Vloertegels zijn gelegd waarna de deur- en raamkozijnen zijn geplaatst. Montage van stopcontacten, verlichting, scrub met kranen, mechanische ventilatie en operatielamp zijn als laatste gedaan. De operatiekamer is gereed voor ingebruikname.

Afspraken/wijzigingen

In overleg met de eind gebruikers hebben we wat extra materialen aangeschaft voor de operatie kamer. Het zijn werkbladen, opbergbakjes voor medicatie die nodig zijn voor tijdens de operatie. Tevens hebben we reserve lampjes voor de operatielamp gekocht. Voor de toegangsdeuren vanaf de gang zijn er gelijk sluitende cilinders aangeschaft om de hoeveelheid sleutels voor de staf te verminderen. Deze laatsten moeten nog gemonteerd worden.


Planning

De operatiekamer kan gebruikt gaan worden. Er zullen nog borstels aan de onderzijde van de deuren worden aangebracht om het gat tussen deuren en tegels dicht te maken i.v.m. de hygiëne. Deze worden verscheept vanuit Nederland.

Foto's



Wandtegels verwijderen

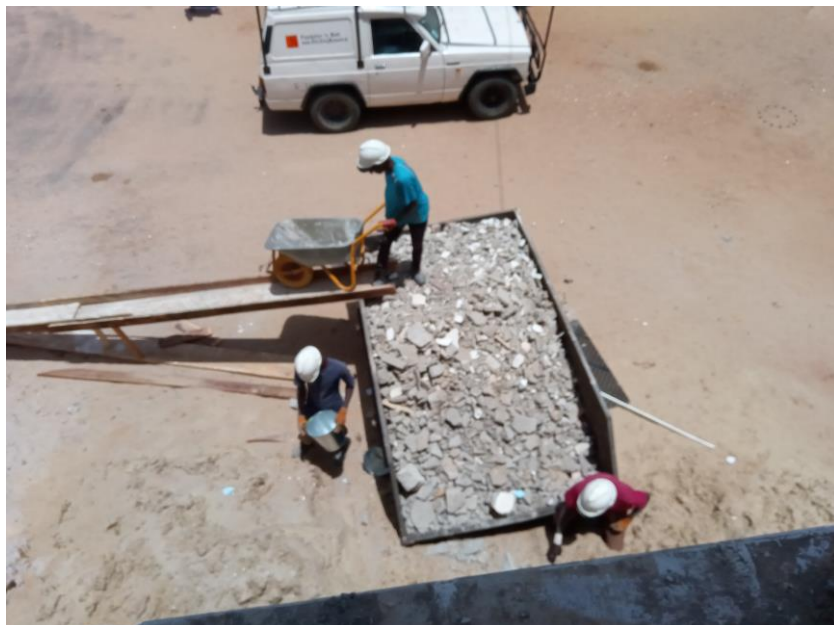

Puin wordt afgevoerd



Deur opening wordt vergroot



Scheidingsmuur tussen operatiekamer en scrub word gemaakt



De muren zijn "ruw" gemaakt voor het nieuwe pleisterwerk




Een installateur geeft kennis overdracht



Nieuw pleisterwerk wordt aangebracht



Pleisterwerk rond de kozijnen

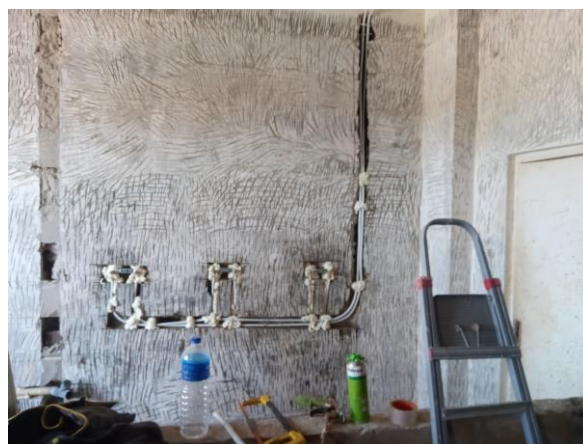

Nieuwe waterleidingen voor de scrub



Pleisterwerk is klaar



Metten voor plafond montage



Het aanbrengen van de hoeklijnen waarop de geïsoleerde plafondplaten rusten



Aanbrengen van de elektra goten

Aansluiten van de bekabeling boven het plafond



Tegelwerk door de studenten



Het tegelen gaat steeds beter



Overbodige bedrading wordt verwijderd



Uitzetten van hoogte voor de afwerkvloer



Het laatste stukje van de vloer wordt glad getrokken



De vloer is tegel klaar



Scrub hangt en is gebruiksklaar



Reparaties aan de operatielamp



Scheidingswand tussen scrub en OK word gemaakt



Operatielamp hangt



Medicatie bakjes op verzoek gemaakt



Overhandiging van de OK aan de chef
