



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 10 Renovatie operatieafdeling ziekenhuis Banjul

Datum : 4 juli 2020
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Renovation Surgery Wing Phase 4A: Main Theatre's, Banjul, project nr. 2016-172DA
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Financiële stand van zaken

Zie bijgevoegd bestand Expences d.d. 1-7. De uitgaven lopen in lijn met het budget. Transport gaat wat over de prognose, maar dat verwachten we met meevallers op andere terreinen op te kunnen vangen.

Voortgang

We hebben zelf de ruimte grotendeels leeg gehaald en het plafond en de airco verwijderd. De airco is opgeslagen voor hergebruik in de gerenoveerde ruimte. Ook de operatielamp met zijn ophangconstructie en de vaste kasten zijn verwijderd. De operatielamp is niet meer bruikbaar en de ingemetselde kasten worden opgeslagen voor evt. hergebruik in de gerenoveerde ruimte.

Vervolgens zijn wanden die we niet meer nodig hebben en tegelwerk gesloopt. Het raam aan de zijkant van de voorgevel is verwijderd, zodat daardoor het slooppafval in een container gestort kan worden. De muuropening voor de doorgang van de anaesthetic room naar de gang langs de voorgevel is gemaakt, de cementdekvloer is verwijderd en voor de scrub die op de nieuwe plek komt is er een sleuf in de vloer voor de afvoerleiding gemaakt.

De voorgevelkozijnen zijn verwijderd en de muren zijn opnieuw gepleisterd. Ook de muuropening voor de nieuwe doorgang van de theatre's naar de corridor is gemaakt en de afvoerleidingen voor de airco's die op nieuwe plekken komen zijn aangelegd. Er zijn bouwblokken gemaakt voor de nieuwe binnenwanden en de toevoerleidingen voor het water zijn aangelegd.

Vervolgens zijn de eerste blokken voor de nieuwe borstweringen uitgezet en zijn de nieuwe borstweringen opgemetseld. De randprofielen voor het plafond zijn gemonteerd, het wandtegelwerk is grotendeels aangebracht en er is een cement dekvloer gemaakt. Ook de kabelgoten voor de elektraleidingen zijn gemonteerd. Twee studenten die via Hogeschool Windesheim in Gambia waren hebben in deze fase kort meegewerkt. Helaas moesten ze vanwege Corona kort na hun aankomst in Gambia weer terug naar Nederland.

Met 2 lampen die in de opslag van het ziekenhuis lagen en ieder incompleet waren is een dubbele operatielamp voor theatre 2 gemaakt. In theatre 1 zal de door Hart voor Gambia gedoneerde lamp opgehangen worden. Er zijn 3 stalen balken aangebracht, waaraan de operatielampen en het plafond worden opgehangen. Het plafond is vervolgens gemonteerd.

Het bovenste deel van de wanden is afgewerkt met vliesbehang en wordt nog geschilderd. De nieuwe voorgevelkozijnen zijn gemonteerd. De hoge raamkozijnen tussen theatre's en corridor zijn verwijderd en de operatielamp in theatre 2 is opgehangen.

De wasbak in de scrub van theatre 1 is opgehangen en alle vloertegelwerk is aangebracht, inclusief een rode lijn van rode tegels die het steriele gebied markeert.

Afspraken/wijzigingen

Bij de aanleg van de airco door derden in het small theatre (fase 3) is een lelijk groot gat gemaakt, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de gevel. Beide kanten zijn weer toonbaar hersteld.

Planning

De komende tijd wordt gewerkt aan het laatste wandtegelwerk, vloesbehang, de verlichting, het ophangen van het sanitair en het plaatsen van de paneelwanden en deuren. Als laatste zal het vloesbehang geschilderd worden.

Foto's



Plafond verwijderen



Wanden slopen



Doorgang van anaesthetic naar gang langs voorgevel



Afvoer voor scrub op nieuwe plek



Verwijderen voorgevelkozijnen



Aanbrengen pleisterwerk



Doorgang van theatre's naar corridor



Aanleg waterleiding



Uitzetten eerste blokken borstweringen



Metselen borstweringen



Monteren randprofielen plafond



Aanbrengen wandtegels



Waterpassen bovenkant borstwering



Gronden voor het vliesbehang



Plaatsen van stalen balk



Aanbrengen van het plafond



Monteren van de nieuwe voorgevelkozijnen



Verwijderen van hoge raamkozijnen tussen theatre's en corridor



Ophangen operatielamp theatre 2



Scrub bij theatre 1



Vloertegelwerk aanbrengen




Rode lijn van tegels



Herstel gat doorvoer airco small theatre (fase 3) buiten- en binnenzijde



Operatielamp theatre 2 hangt

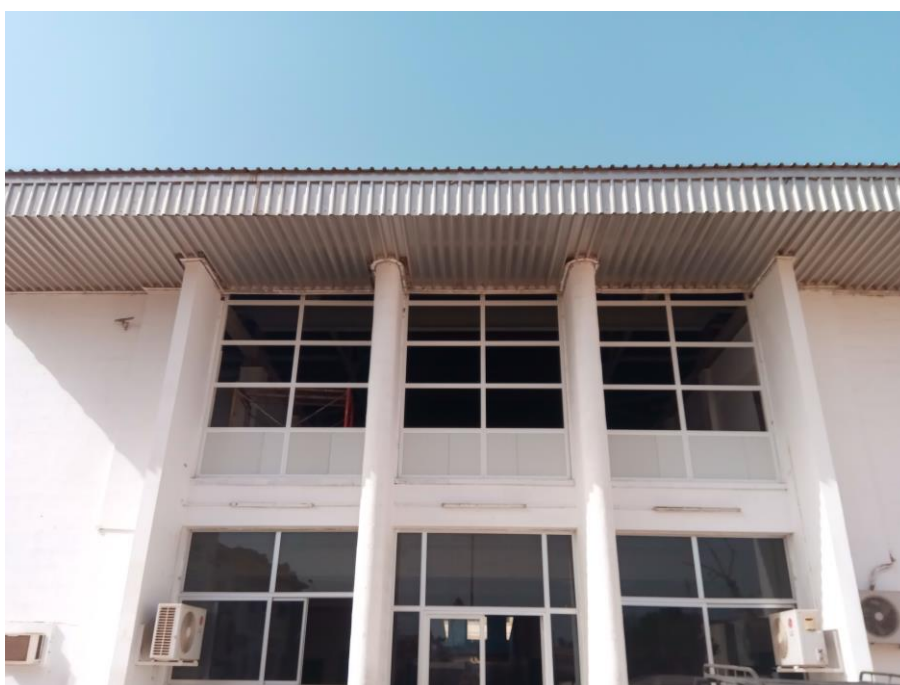

Nieuwe voorgevelkozijnen
