



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 11 Renovatie operatieafdeling ziekenhuis Banjul

Datum : 7 januari 2021
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Renovation Surgery Wing Phase 4A: Main Theatre's, Banjul, project nr. 2016-172DA
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Voortgang

De nieuwe binnenwanden en -deuren van aluminium zijn geplaatst. De beglazing van de buitengevel is geplaatst. De tweede scrub (theatre 2) is opgehangen. Alle kranen en stopcontacten zijn gemonteerd.

Beide operatie lampen zijn operationeel.

We zijn bezig met het laatste tegelwerk (afwerking). Alle verlichting is gemonteerd en de plafond afzuiging is aangesloten.

De werkbladen zijn gemonteerd. De elektriciteit is aangesloten op het hoofdnet van het ziekenhuis. En de back-up voor de elektra bij stroomuitval is aangesloten.

Afspraken/wijzigingen

De oude airco's die weer terug zouden komen worden niet gebruikt. Het ziekenhuis heeft zelf 2 nieuwe units aangeschaft die inmiddels zijn gemonteerd. We hebben wel wat materialen geleverd (elektrakabel en kabelgoten), zodat de machines werkend konden worden gemaakt.

Bij de recovery (fase 2, nu tijdelijk in gebruik als OK) waren de onder-panelen van de beide "swing doors" door bedden beschadigd (gebroken panelen). De kozijnen leverancier heeft daar bij zowel de beschadigde swing doors, die hersteld zijn, als bij de nieuwe swing doors in de latere fasen (3 en 4A) op verzoek nu verstevingen in aangebracht zodat ze beter bestand zijn tegen botsingen met bedden.

Planning

Op het moment wordt het schilderwerk uitgevoerd. We starten zo snel mogelijk met het aanbrengen van het glas in de binnenwanden en -deuren. Verder rest dan alleen het opruimen en schoonmaken.

Foto's



Plaatsen van de nieuwe kozijnen in de gang



Nieuwe scheidingswanden van de kamers



Ophangen van operatielamp OK 1



Nieuwe wanden op stenen scheidingsmuur



Operatielamp OK1 werkt




Stellen van de wand elementen



Afhangen van een toegangsdeur van OK1




Deuren van de OK uitgangen

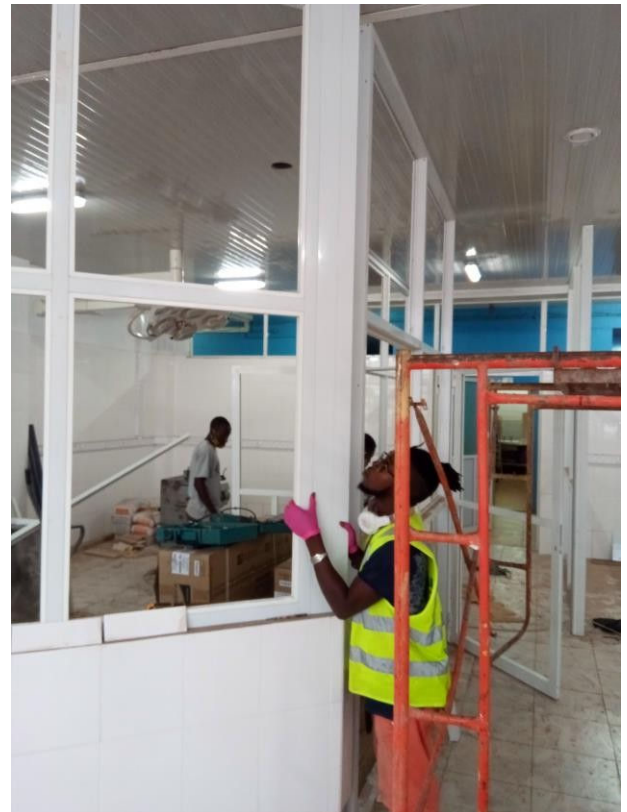

Afwerking van de aansluitingen tussen de elementen



Montage van de nieuwe airco

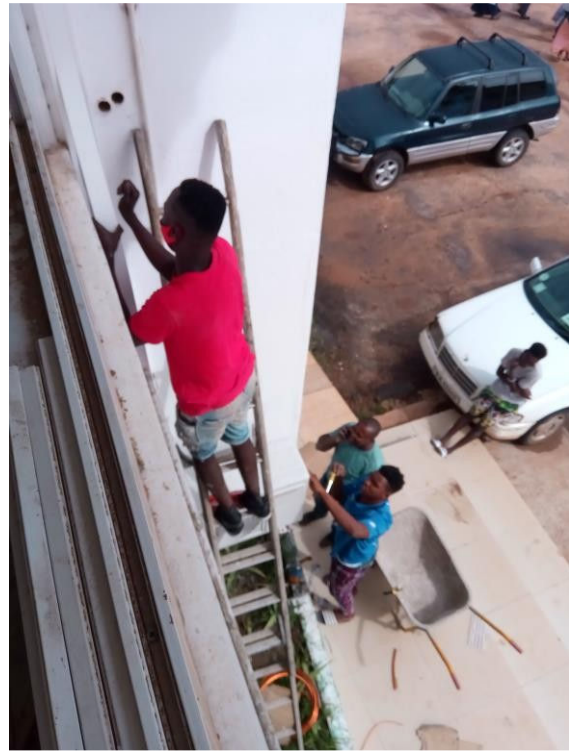

Leidingwerk in goten weg gewerkt



Versteviging gemaakt in toegangsdeur recovery



Deuren bij scrub OK1



De ruiten zitten in de nieuwe voorgevel.



Aansluiten elektra op hoofdnet ziekenhuis



Werkbladen gemonteerd



Back-up voor de elektra bij stroomuitval (UPS)
